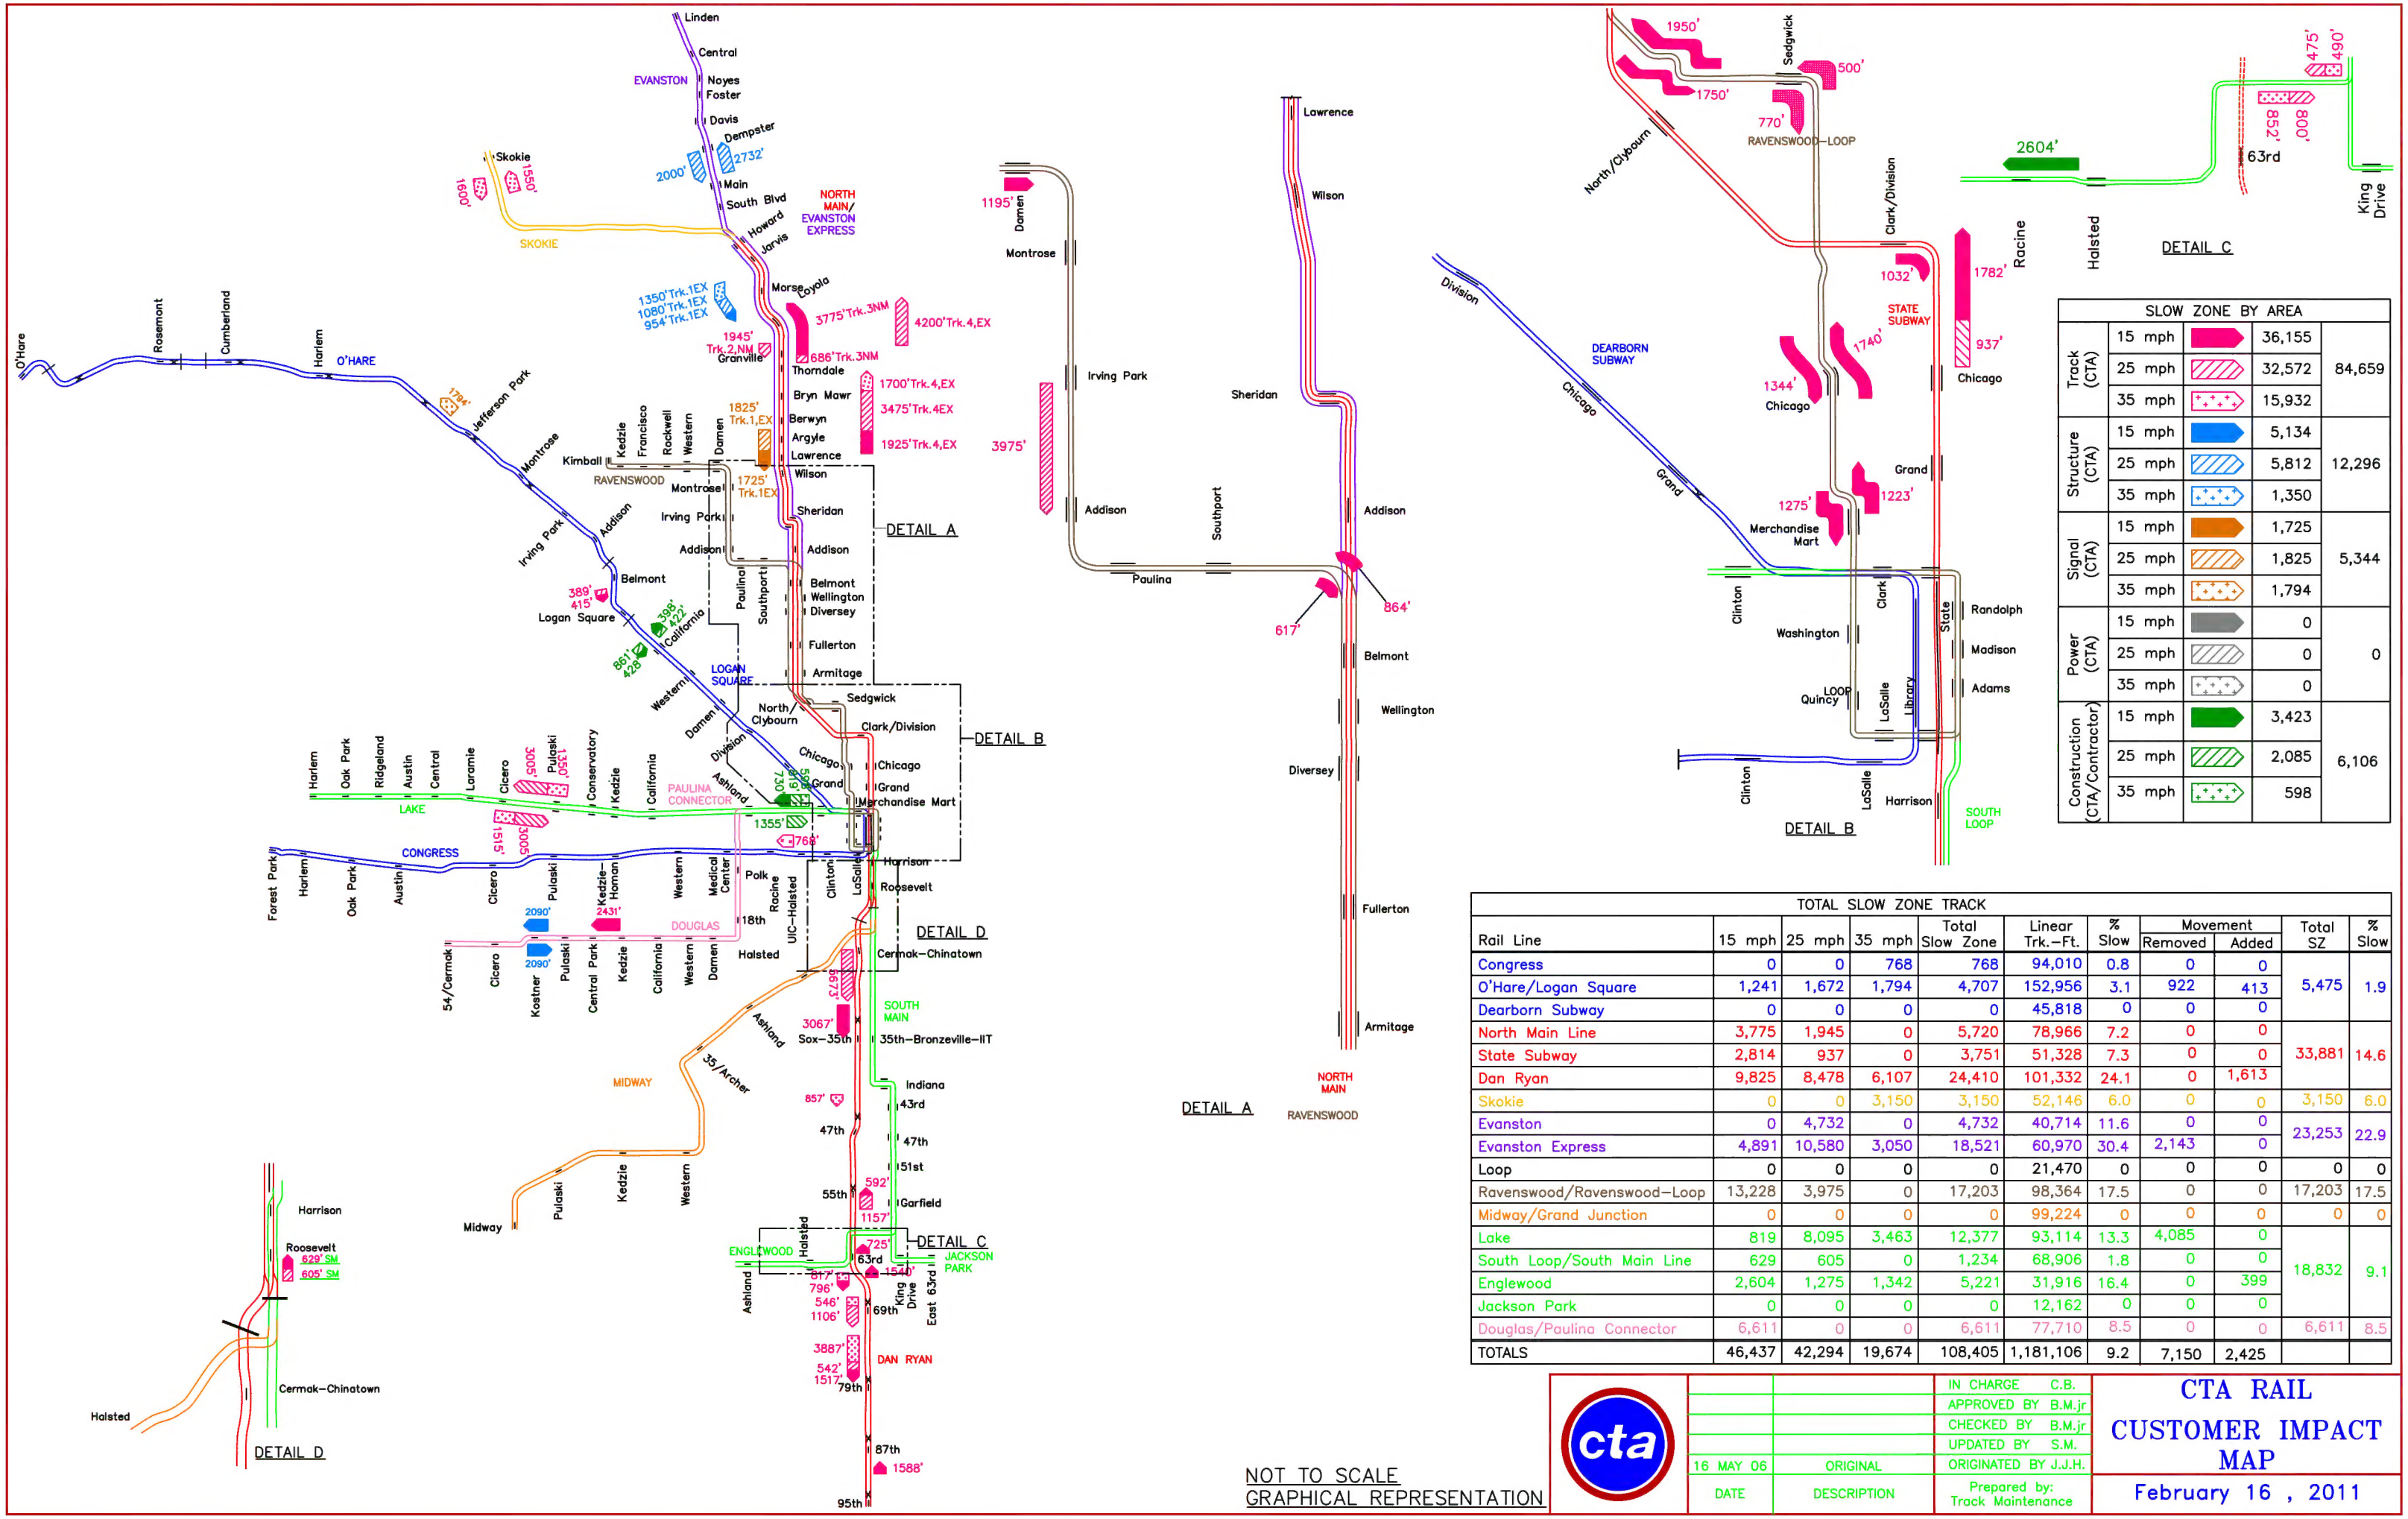

SLOW ZONE BY AREA				
Track (CTA)	15 mph	36,155	84,659	
	25 mph	32,572		
	35 mph	15,932		
Structure (CTA)	15 mph	5,134	12,296	
	25 mph	5,812		
	35 mph	1,350		
Signal (CTA)	15 mph	1,725	5,344	
	25 mph	1,825		
	35 mph	1,794		
Power (CTA)	15 mph	0	0	
	25 mph	0		
	35 mph	0		
Construction (CTA/Contractor)	15 mph	3,423	6,106	
	25 mph	2,085		
	35 mph	598		

TOTAL SLOW ZONE TRACK

Rail Line	15 mph	25 mph	35 mph	Total Slow Zone	Linear Trk.–Ft.	% Slow	Movement Removed	Movement Added	Total SZ	% Slow
Congress	0	0	768	768	94,010	0.8	0	0	5,475	1.9
O'Hare/Logan Square	1,241	1,672	1,794	4,707	152,956	3.1	922	413		
Dearborn Subway	0	0	0	0	45,818	0	0	0		
North Main Line	3,775	1,945	0	5,720	78,966	7.2	0	0	33,881	14.6
State Subway	2,814	937	0	3,751	51,328	7.3	0	0		
Dan Ryan	9,825	8,478	6,107	24,410	101,332	24.1	0	1,613		
Skokie	0	0	3,150	3,150	52,146	6.0	0	0	3,150	6.0
Evanston	0	4,732	0	4,732	40,714	11.6	0	0	23,253	22.9
Evanston Express	4,891	10,580	3,050	18,521	60,970	30.4	2,143	0		
Loop	0	0	0	0	21,470	0	0	0	0	0
Ravenswood/Ravenswood–Loop	13,228	3,975	0	17,203	98,364	17.5	0	0	17,203	17.5
Midway/Grand Junction	0	0	0	0	99,224	0	0	0	0	0
Lake	819	8,095	3,463	12,377	93,114	13.3	4,085	0	18,832	9.1
South Loop/South Main Line	629	605	0	1,234	68,906	1.8	0	0		
Englewood	2,604	1,275	1,342	5,221	31,916	16.4	0	399		
Jackson Park	0	0	0	0	12,162	0	0	0		
Douglas/Paulina Connector	6,611	0	0	6,611	77,710	8.5	0	0	6,611	8.5
TOTALS	46,437	42,294	19,674	108,405	1,181,106	9.2	7,150	2,425		

NOT TO SCALE
GRAPHICAL REPRESENTATION

DATE	DESCRIPTION	
		IN CHARGE C.B.
		APPROVED BY B.M.jr
		CHECKED BY B.M.jr
		UPDATED BY S.M.
16 MAY 06	ORIGINAL	ORIGINATED BY J.J.H.
		Prepared by: Track Maintenance

CTA RAIL CUSTOMER IMPACT MAP

February 16 , 2011
